PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E104

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71141495 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-1495-02	*	**MXCR**	**YSD 3500315495**	*







Anvil		
7114-1495XA		(N)
CW (c) 1,67	*CW (i)* 2,80	







Wire Crimper	
7114-1495XW	(1)
CW 1,65	

Insulation Crimper	
7114-1495XIC	(1)
CW 2,80	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,85	0,85	4,10
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1,00	5,36
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.20mm²~0.85mm²
The wire size 0.30mm² is not recommended due to crimping microcut conditions
SIZE-0.35mm² C/W(I)-2.78mm
SIZE-0.85mm² C/W(I)-2.80mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
Date: 2023/out/11	Date: 2023/out/11	Date: 2023/out/11

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E104

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: T2IRSAPL

Wire size: 0,35 mm²

Nominal Cr. Height:	0,85	1,9	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,851	1,905
2	0,843	1,909
3	0,843	1,901
4	0,844	1,909
5	0,847	1,907
6	0,848	1,896
7	0,858	1,894
8	0,847	1,893
9	0,846	1,901
10	0,846	1,903
11	0,850	1,906
12	0,845	1,908
13	0,849	1,906
14	0,845	1,906
15	0,847	1,903
16	0,846	1,898
17	0,850	1,901
18	0,853	1,896
19	0,854	1,901
20	0,848	1,901
21	0,850	1,903
22	0,853	1,906
23	0,848	1,908
24	0,847	1,903
25	0,853	1,904
26	0,853	1,903
27	0,849	1,900
28	0,853	1,908
29	0,853	1,900
30	0,843	1,903
31	0,849	1,895
32	0,854	1,889
33	0,852	1,896
34	0,854	1,903
35	0,856	1,901
36	0,856	1,901
37	0,850	1,893
38	0,856	1,904
39	0,852	1,903
40	0,848	1,901
41	0,853	1,905
42	0,848	1,903
43	0,861	1,907
44	0,853	1,903
45	0,853	1,905
46	0,850	1,908
47	0,853	1,904
48	0,854	1,905
49	0,848	1,906
50	0,848	1,906
Average	0,85	1,90
Cmk	4,10	7,12

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS

Wire size: 0,85 mm²

Nominal Cr. Height:	1	2,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

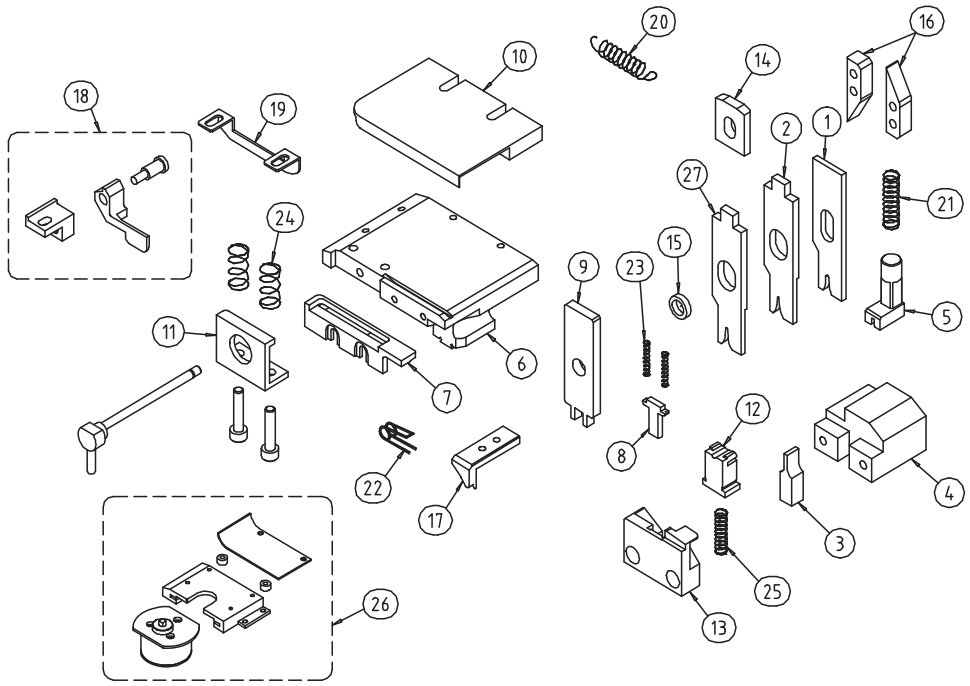
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,001	2,203
2	1,000	2,198
3	1,000	2,200
4	1,000	2,198
5	0,999	2,196
6	1,001	2,199
7	0,999	2,197
8	1,001	2,194
9	0,999	2,200
10	0,999	2,194
11	1,001	2,200
12	1,000	2,200
13	1,001	2,197
14	1,001	2,199
15	1,000	2,196
16	1,000	2,203
17	0,997	2,195
18	0,998	2,192
19	0,999	2,191
20	1,001	2,197
21	0,999	2,196
22	0,999	2,204
23	1,004	2,195
24	1,005	2,197
25	1,004	2,198
26	1,002	2,200
27	1,002	2,201
28	1,003	2,201
29	1,003	2,202
30	1,003	2,203
31	1,002	2,204
32	1,003	2,206
33	1,013	2,197
34	1,002	2,200
35	1,003	2,201
36	1,002	2,199
37	1,002	2,205
38	1,002	2,194
39	0,994	2,205
40	0,994	2,199
41	1,001	2,197
42	0,997	2,197
43	1,001	2,199
44	1,000	2,202
45	1,009	2,194
46	0,999	2,193
47	0,998	2,203
48	1,000	2,197
49	1,000	2,194
50	1,000	2,199
Average	1,00	2,20
Cmk	5,36	9,16

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	TEMPORARY	TERMINAL No. 端子品番	7114-1495-C
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-1495XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-1495XIC		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-1495XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-1495XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-1495XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-1495XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-1495XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-1495XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	011	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

TEMPORARY

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					DESIGNED DATE 設計日		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
